



**DELIBERATION N° 25/060 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
PRENANT ACTE DU RAPPORT D'INFORMATION SUR LE DÉPLOIEMENT ET LA
COMMERCIALISATION DU RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT POUR LA CORSE**

**CHÌ PIGLIA ATTU DI U RAPORTU D'INFURMAZIONE IN QUANTU À A
SPARGHJERA È A CUMMERCIALIZAZIONE DI U RETALE DI A FIBRA PÈ A
CORSICA**

SEANCE DU 24 AVRIL 2025

L'an deux mille vingt cinq, le vingt quatre avril, l'Assemblée de Corse, convoquée le 11 avril 2025, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Hyacinthe VANNI, Vice-président de l'Assemblée de Corse.

ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.

Jean-Christophe ANGELINI, Véronique ARRIGHI, Serena BATTESTINI, Paul-Félix BENEDETTI, Didier BICCHIERAY, Jean-Marc BORRI, Valérie BOZZI, Marie-Claude BRANCA, Paul-Joseph CAITUCOLI, Françoise CAMPANA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Cathy COGNETTI-TURCHINI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Petru Antone FILIPPI, Lisa FRANCISCI-PAOLI, Eveline GALLONI D'ISTRIA, Pierre GHIONGA, Jean-Charles GIABICONI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Ghjuvan'Santu LE MAO, Jean-Jacques LUCCHINI, Don Joseph LUCCIONI, Antonia LUCIANI, Saveriu LUCIANI, Sandra MARCHETTI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Georges MELA, Paula MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Jean-Paul PANZANI, Chantal PEDINIELLI, Véronique PIETRI, Antoine POLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Jean-Noël PROFIZI, Jean-Michel SAVELLI, Jean-Louis SEATELLI, Charlotte TERRIGHI, Elisa TRAMONI, Hervé VALDRIGHI, Hyacinthe VANNI, Alex VINCIGUERRA

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :

Mme Danielle ANTONINI à M. Don Joseph LUCCIONI
Mme Vanina BORROMEI à M. Pierre POLI
Mme Angèle CHIAPPINI à Mme Christelle COMBETTE
Mme Anna Maria COLOMBANI à Mme Eveline GALLONI D'ISTRIA
M. Pierre GUIDONI à Mme Cathy COGNETTI-TURCHINI
Mme Vanina LE BOMIN à M. Saveriu LUCIANI
Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS à M. Hyacinthe VANNI
M. Jean-Martin MONDOLONI à Mme Marie-Thérèse MARIOTTI
Mme Marie-Anne PIERI à M. Didier BICCHIERAY
M. Paul QUASTANA à Mme Marie-Claude BRANCA
M. Joseph SAVELLI à Mme Muriel FAGNI
M. François SORBA à M. Petru Antone FILIPPI

Mme Julia TIBERI à M. Jean-Christophe ANGELINI

ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.

Flora MATTEI, Charles VOGLIMACCI

L'ASSEMBLEE DE CORSE

- VU** le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie, et notamment ses articles L. 4421-1 à L. 4426-1 et R. 4425-1 à D. 4425-53,
- VU** la délibération n° 16/173 AC de l'Assemblée de Corse du 29 juillet 2016 approuvant la mise en œuvre opérationnelle de la première phase du schéma directeur territorial d'aménagement numérique de Corse,
- VU** la délibération n° 18/226 AC de l'Assemblée de Corse du 29 juin 2018 autorisant le Président du Conseil exécutif de Corse à signer la convention de délégation de service public relative à la conception, à l'établissement et à l'exploitation du réseau très haut débit de la Corse,
- VU** la convention de délégation de service public relative à la conception, à l'établissement et à l'exploitation du réseau très haut débit FTTH signée entre la Collectivité de Corse et SFR Collectivités le 16 octobre 2018 et notifiée le 16 octobre 2018,
- VU** la délibération n° 19/189 AC de l'Assemblée de Corse du 27 juin 2019 approuvant l'avenant n° 1 à la convention de délégation de service public relative à la conception, à l'établissement et à l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit FTTH,
- VU** la délibération n° 21/119 AC de l'Assemblée de Corse du 22 juillet 2021 approuvant le cadre général d'organisation et de déroulement des séances publiques de l'Assemblée de Corse, modifiée,
- VU** la délibération n° 21/195 AC de l'Assemblée de Corse du 18 novembre 2021 adoptant le règlement budgétaire et financier de la Collectivité de Corse,
- VU** la délibération n° 22/074 AC de l'Assemblée de Corse du 2 juin 2023 approuvant le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique de la Corse - Smart Isula,
- VU** la délibération n° 20/219 CP de la Commission Permanente du 17 décembre 2020 approuvant l'avenant n° 2 à la convention de délégation de service public relative à la conception, à l'établissement et à l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit FTTH,
- VU** la délibération n° 22/204 CP de la Commission Permanente du 14 décembre 2022 approuvant l'avenant n° 3 à la convention de délégation de service public relative à la conception, à l'établissement et à l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit FTTH,

VU la délibération n° 24/105 CP de la Commission Permanente du 24 juillet 2024 approuvant l'avenant n° 4 à la convention de délégation de service public relative à la conception, à l'établissement et à l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit FTTH,

SUR rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,

APRES EN AVOIR DELIBERE

À l'unanimité,

ARTICLE PREMIER :

PREND ACTE du point d'étape sur le déploiement et la commercialisation du réseau Très Haut Débit pour la Corse, joint à la présente délibération.

ARTICLE 2 :

La présente délibération fera l'objet d'une publication sous forme électronique sur le site internet de la Collectivité de Corse.

Aiacciu, le 24 avril 2025

La Présidente de l'Assemblée de Corse,



Marie-Antoinette MAUPERTUIS

ASSEMBLEE DE CORSE

1 ERE SESSION ORDINAIRE DE 2025

REUNION DES 24 ET 25 AVRIL 2025

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

RAPORTU D'INFURMAZIONE IN QUANTU À A
SPARGHJERA È A CUMMERCIALIZAZIONE DI U RETALE
DI A FIBRA PÈ A CORSICA

RAPPORT D'INFORMATION SUR LE DÉPLOIEMENT ET
LA COMMERCIALISATION DU RÉSEAU TRÈS HAUT
DÉBIT POUR LA CORSE

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Contexte et objet du rapport

À partir de 2016, le dossier du déploiement d'un réseau de télécommunications électroniques optimal pour la Corse a été relancé, à travers notamment les chantiers du haut débit et du très haut débit qui ont été érigés par le Président du Conseil exécutif de Corse comme une priorité stratégique de la Collectivité de Corse.

En effet, avant l'arrivée aux responsabilités du Conseil exécutif, ce chantier ne semblait pas se concrétiser et l'approche choisie était davantage centrée sur les grandes agglomérations de l'île.

Le 16 octobre 2018, la convention de la délégation de service public relative à la conception, à l'établissement et à l'exploitation du réseau Très Haut Débit pour la Corse a ainsi été signée entre la Collectivité de Corse et l'opérateur SFR Collectivités.

Depuis, le délégataire Corsica Fibra déploie activement le réseau Très Haut Débit sur le territoire insulaire.

Le présent rapport propose un point d'étape arrêté au **31 décembre 2024** sur le déploiement et la commercialisation du réseau à Très Haut Débit pour la Corse.

Il s'inscrit dans la démarche d'information initiée auprès de l'Assemblée de Corse concernant le réseau très haut débit :

- Un premier rapport, arrêté au 1^{er} octobre 2021, ayant été présenté le 28 octobre 2021 (délibération n° 21/179 AC du 28 octobre 2021).
- Un second rapport, arrêté au 5 mai 2022, ayant été présenté le 29 juillet 2022 (délibération n° 22/122 AC du 29 juillet 2022).
- Un troisième rapport, arrêté au 1^{er} mars 2023, ayant été présenté le 26 mai 2023 (délibération n° 23/066 AC du 26 mai 2023).
- Un quatrième rapport, arrêté au 15 octobre 2023, ayant été présenté le 30 novembre 2023 (délibération n° 23/146 AC du 30 novembre 2023).
- Un cinquième rapport, arrêté au 31 mars 2024, ayant été présenté le 25 juillet 2024 (délibération n° 24/096 AC du 25 juillet 2024).

Synthèse du point d'étape du déploiement arrêté au 31 décembre 2024

Investissement de la Collectivité de Corse :

- Coût global du projet : 327 M€ ;

- Sur ces 327 M€, 52 M€ de subvention publique sont alloués au délégataire (Corsica Fibra), cofinancée à 67 % par l'État et 33 % par la CdC (soit 17,2 M€) ;
- Sur ces 52 M€ de subvention publique, la moitié a été versée à date au délégataire.

Déploiement :

- 72 nœuds de raccordement optique (NRO), 416 points de mutualisation (PM), 170 069 prises Très Haut Débit et plus de 7 000 km de fibre optique étaient prévus dans la convention ;
- Au 31 décembre 2024, 72 NRO, 600 PM et 180 380 prises FttH ont été construits, soit 106 % des prises contractuellement prévues ;
- Relativement aux 170 069 prises prévues initialement, la cible est désormais de 192 000 afin de prendre en compte les constructions nouvelles ;

Par ailleurs, depuis le 31 décembre 2024 :

- 4 663 prises ont été construites au 1^{er} trimestre 2025 sur les 4 429 prises prévues, soit 105,3 % de l'objectif ;
- 4 120 locaux ont été rendus « commercialisables », c'est-à-dire éligibles à un abonnement FttH auprès d'un opérateur ;
- D'ici quelques semaines, le réseau couvrira 344 communes, à savoir toutes les communes de Corse à l'exception de celles de la CAB, de la CAPA et de la commune de Biguglia (qui constituent la zone d'initiative privée).

Éléments complémentaires :

- Le déploiement de la fibre s'est accompagné de la mise en œuvre d'une politique favorisant l'insertion par l'emploi et la formation, en permettant de diplômer près de 300 jeunes corses dans le cadre d'un partenariat Collectivité de Corse/AFP (dont 253 ont obtenu un CDI, soit 91 % de diplômés) ;
- À travers une expérimentation innovante, la Collectivité de Corse a souhaité que le raccordement soit mis en œuvre de bout en bout par Corsica Fibra, et non pas via un mode STOC, c'est à dire de sous-traitance par les opérateurs commerciaux (pour lequel un certain nombre d'impact négatifs sont identifiés), afin de mieux maîtriser le déploiement et garantir un raccordement optimal de tous les foyers.

Ce point d'étape permet de mesurer les avancées du projet sous divers aspects (administratif, financier, opérationnel, commercial et communication).

Je vous propose de bien vouloir prendre acte du présent rapport, ainsi que du rapport d'information sur le déploiement et la commercialisation du réseau très haut débit pour la Corse en annexe.

JANVIER 2025

**RAPPORT D'INFORMATION
SUR LE DÉPLOIEMENT ET
LA COMMERCIALISATION DU RÉSEAU
À TRÈS HAUT DÉBIT POUR LA CORSE**



TABLE DES MATIÈRES

Sunta/Préambule	3
Présentation de la convention de délégation de service public	5
Engagements contractuels de déploiement	5
Financements publics de l'opération.	5
La société Corsica Fibra	5
Point d'étape du déploiement	6
Focus sur les déploiements de prises	6
Nombre de prises construites par commune.....	6
Focus sur les déploiements de NRO.....	7
Génie civil – enfouissements.....	7
Pose de NRO	8
Focus sur les déploiements de PM	9
Point sur la négociation avec les bailleurs pour les « conventions immeuble »	9
Point d'étape de la commercialisation des prises	10
Nombre de prises commercialisées par commune.....	11
Bilan de la souscription d'abonnements par les usagers finaux.....	11
Taux de pénétration de marché	11
Adressage	12
Communes pour lesquelles une subvention a été attribuée	13
Elagage	14
Audits et contrôles du réseau	15
Point financier	16
Versement de la subvention au délégataire.....	16
Part des versements FSN et PEI perçue par la CdC.....	16
Part des redevances pour frais de contrôle perçue par la Collectivité de Corse.....	16
Point d'étape formation, insertion et emploi	17
Point d'étape sur le numérique inclusif et le développement des usages	18
Digital Factory in Paesi.....	18
Événement territorii di dumane	19
E Ghjurnate Smart Isula	20
Concertation Collectivité de Corse – Corsica Fibra	21
Glossaire/ou FAQ	22
Annexe	23

PRÉAMBULE

Dès 2016, le Président du Conseil exécutif de Corse décidait de donner une nouvelle impulsion à la politique d'aménagement numérique de la Corse en matière de Haut Débit et de Très Haut Débit.

Les chantiers du Haut Débit et du Très Haut Débit ont été érigés comme une priorité stratégique de la Collectivité de Corse autour de 4 ambitions :

- ✓ **Répondre aux besoins des territoires insulaires** en situation de fracture numérique avérée,
- ✓ **Éviter de construire une Corse à deux vitesses**, avec le Très Haut Débit sur les agglomérations de Bastia et d'Aiacciu et le Haut Débit ailleurs,
- ✓ **Comblent au plus vite la fracture territoriale** de plus en plus douloureuse pour les territoires situés en zones rurales,
- ✓ **Remplacer définitivement le réseau cuivre** existant et vétuste par de la fibre optique.

Le présent rapport offre un point d'étape arrêté au 31 décembre 2024 sur le déploiement et la commercialisation du réseau à Très Haut Débit pour la Corse. Il met à jour celui présenté à l'Assemblée de Corse lors de sa session du 25 juillet 2024 (Délibération 24/096 AC)

PRÉSENTATION DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC



Le 16 octobre 2018 (date de signature de la convention de la délégation de service public relative à la conception, à l'établissement et à l'exploitation du réseau très haut débit pour la Corse) constitue la date de référence de l'exécution du contrat.

Le contrat de concession a été souscrit entre SFR Collectivités et la Collectivité de Corse pour une durée de 30 ans.

52 M€ de fonds publics ont été investis pour valoriser près de 275 M€ de travaux d'établissement. 327 M€ sont investis au total sur la durée du contrat.

La convention prévoit le déploiement de 170 069 prises Très Haut Débit, et de 7 000 kilomètres d'infrastructure en fibre optique sur une période de 5 années. Le réseau couvrira 344 communes, à savoir toutes les communes de Corse à l'exception de la CAB, de la CAPA et de Biguglia (qui constituent la zone d'initiative privée, dite Zone AMII*).


* Zone AMII : Zone d'Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement, relevant de l'initiative privée. En Corse, Orange est l'opérateur d'infrastructures sur les 2 zones AMII. La première concerne la Communauté d'Agglomération de Bastia (CAB) et Biguglia, l'autre concerne la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA).

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DE DÉPLOIEMENT (AVENANT 3) EXPRIMÉS EN CUMULÉ

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
NRO	5	15	38	54	72	72	72
PM	27	131	354	446	599	599	599
Prises	11 402	32 466	71 400	110 567	147 155	170 069	170 069

La convention prévoit la pose de 72 NRO, 599 PM et 170 069 prises optiques raccordant l'ensemble des locaux raccordables de Corse.

FINANCEMENT PUBLIC DE L'OPÉRATION

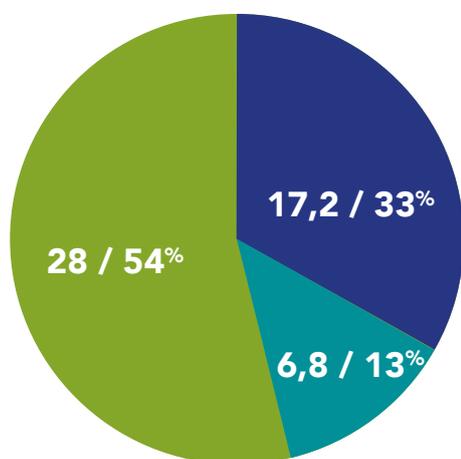

Le financement public de l'opération prévoit **52 M€** de subvention publique alloués au délégataire et versés au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Ils se répartissent de la façon suivante :

- **34,64 M€ provenant de l'Etat** dans lesquels 28 M€ sont alloués au titre du Fonds pour la Société Numérique et 6,84 M€ au titre du PEI. Soit un cofinancement de l'Etat de 67%.
- Un financement de la **Collectivité de Corse de 17,2 M€**.

Financement publics (en M€) ● CdC ● PEI ● FSN

LA SOCIÉTÉ CORSICA FIBRA

Suite à l'avenant 1, SFR FTTH s'est substituée à SFR Collectivité en tant que maison mère de Corsica Fibra.

La dernière réorganisation du groupe a changé la dénomination sociale de SFR FTTH par XpFibre. Il ne s'agit que d'un changement de dénomination commerciale de la maison mère, n'ayant aucun impact juridique ni financier sur la DSP FTTH et ne nécessitant pas de figurer dans un avenant.

Conformément à l'Article 4 de la convention, une filiale dédiée a été créée. Elle se nomme Corsica Fibra. Cette filiale est détenue à 100% par XpFibre. La société a été créée le 20 novembre 2018 et sa forme juridique est une Société par Actions Simplifiée à Associé Unique (SASU).

Conformément à l'Article 8 de la convention, son capital social a été porté à 15 M€.

La mise en place opérationnelle de la société s'est faite au cours du premier trimestre 2019 avec 3 employés ; soit 4 mois après la signature du contrat.

Ses locaux se situent à Bastia (Immeuble La Nina, Rue Jean Pierre Gaffory).

Au 31 décembre 2024, Corsica Fibra compte 5 collaborateurs dédiés travaillant en Corse. Plusieurs dizaines collaborateurs sont mobilisées au sein de XpFibre et du groupe ALTICE en support au déploiement et pour assurer les fonctions transverses.

POINT D'ÉTAPE DU DÉPLOIEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2024

180 380 prises ont été livrées sur 170 169 prises prévues aux objectifs annuels de la convention.


72 NRO ont été posés sur 72 NRO prévus à la convention.

599 PM ont été posés sur 599 PM prévus.

	Engagement 2022	Réalisé 2022	Engagement 2023	Réalisé 2023	Engagement 2024	Réalisé au 31 décembre 2024
NRO	57	54	72	68	72	72
PM	327	467	599	570	599	599
Prises construites	109 389	118 820	147 155	149 000	170 069	180 380

Les chiffres sont exprimés **en cumulé**.

FOCUS SUR LES DÉPLOIEMENTS DE PRISES (AU 31 DÉCEMBRE 2024)

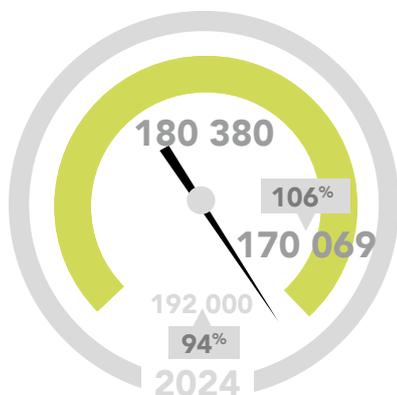

Au 31 décembre 2024, **106 % des prises prévues aux jalons annuels du contrat sont construites**.

Aux 170 069 prises prévues au total, se rajouteront les constructions neuves récentes et les locaux non piquetés initialement.

Le nombre total de prises prévues, **densification comprise**, au 31/12/2024, est d'environ 192 000 prises.

NOMBRE DE PRISES CONSTRUITES PAR COMMUNE

Un tableau relatif au calendrier de déploiement par communes est disponible en annexe du présent rapport. Le tableau présente notamment le nombre de prises construites par communes

Au total, **180 080 prises ont été construites au 31 décembre 2024**, sur 170 069 prises prévues au total selon les jalons annuels de la convention.

GÉNIE CIVIL – ENFOUISSEMENTS


A ce jour, plus de 4 300 kms de câbles à fibre optique ont été posés dont 2 600 kms en souterrain. **Plus de 600 kms de réseaux souterrains ont été créés pour accueillir ces câbles.** A date Corsica Fibra a implanté 20 poteaux (Plaine U Borgu). A titre de comparaison, Orange possède 145 000 poteaux en Corse.

FOCUS SUR LES DÉPLOIEMENTS DE NRO EN T4-2024

100% des 72 NRO prévus au total ont été posés au 31 décembre 2024, soit 100% de l'objectif.

NRO posés au 31 décembre 2024

Locu/Commune	Nbr prises potentiel	Locu/Commune	Nbr prises potentiel
Alandu	553	Ulimiccia	1090
Aleria	1349	Omessa	1069
A Bastilicaccia	7616	Ota	1238
Bunifaziu	3413	Palasca	1450
Brandu	940	A Penta di Casinca	3793
Calacuccia	1883	Pitretu è Bicchisgià	1098
Calcatoghju	2246	A Piana	1034
Calinzana	2327	U Pianellu	1042
Calvi	5674	Pianottuli è Caldareddu	2337
Canari	1779	Pedicroce	1774
Carbini	751	Portivechju	9577
Cargèse	1260	Prupìa	5484
Castellu di Rustinu	1055	I Prunelli di Fiumorbu	1443
I Catari	1695	Ruglianu	2493
Coghja	1244	Santa Maria Sichè	2295
Corti	4876	San Fiorenzu	4102
Coti Chjavari	1753	San Ghjulianu	2297
Eccica è Suaredda	1288	Santa Maria Poghju	5330
Evisa	1093	Sartè	2377
Galéria	701	A Sarra di Farru	1654
A Ghisunaccia	4873	Siscu	2705
Ghisoni	1380	U Sulaghju	3635
La marana (Lucciana 2)	2706	Surbuddà	2261
Lama	849	Sotta	1181
Lecci	4210	U Spiluncatu	1450
Livia	1114	Aucciani	1994
Lucciana	4748	Venacu	2108
Lumiu	3652	A Venzulasca	3916
Luri	1271	Vicu	2511
Moltifau	1603	A Vulpaiola	1304
Munticellu	7702	Zonza	4804
Altiani	891	Cugnoculu è Muntichji	674
Bastelica	830	U Quarcitellu / Ghjucatoghju	1281
Castineta/Gavignanu	1426	Muratu	1972
Ciamanaccia	1615	U Salge	1184
U Petrosu	463	POP Lucciana	N/A

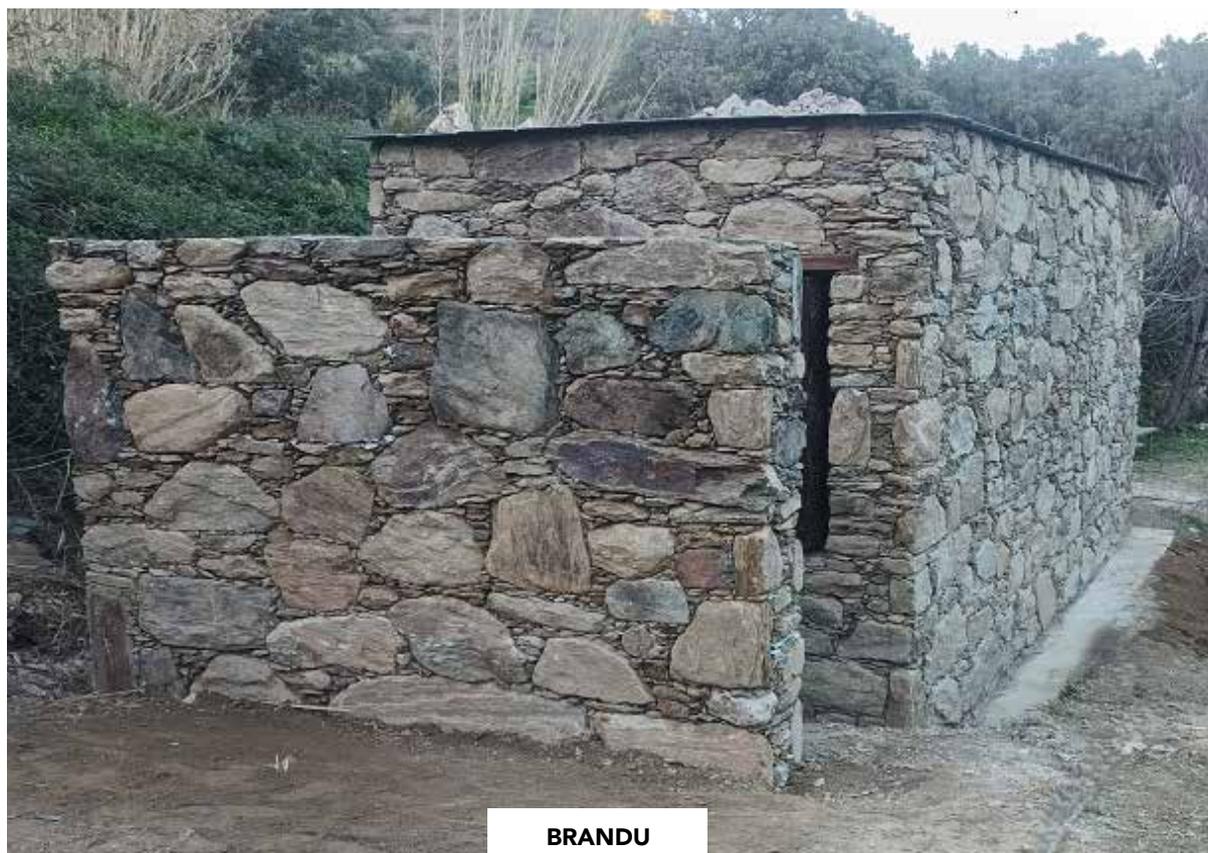

BRANDU

FOCUS SUR LE DÉPLOIEMENT DE PM EN 2024

Au 31 décembre 2024, **599 PM ont été posés sur les 599 attendus** conformément à l'avenant 3 en vigueur. Dans l'optique d'optimiser la qualité du réseau, l'objectif de nombre de PM déployés est passé de 416 PM à 599 PM (validé dans l'avenant 3).



Exemple de PM posé


POINT SUR LA NÉGOCIATION AVEC LES BAILLEURS POUR LES « CONVENTIONS IMMEUBLE »

Les conventions immeubles sont essentielles afin de permettre au réseau Très Haut Débit d'atteindre chaque logement. Elles nécessitent un travail d'information et de concertation avec les bailleurs (syndics, propriétaires publics ou privés, offices HLM, etc.) afin de pouvoir procéder à leur signature. Sans elles, le réseau ne peut être finalisé.

Au 31 décembre 2024, **3 240 conventions** ont été signées pour **60 817 logements**.

POINT D'ÉTAPE SUR LA CONSTRUCTION DES PRISES JANVIER 2025

Cartographie des prises construites par commune

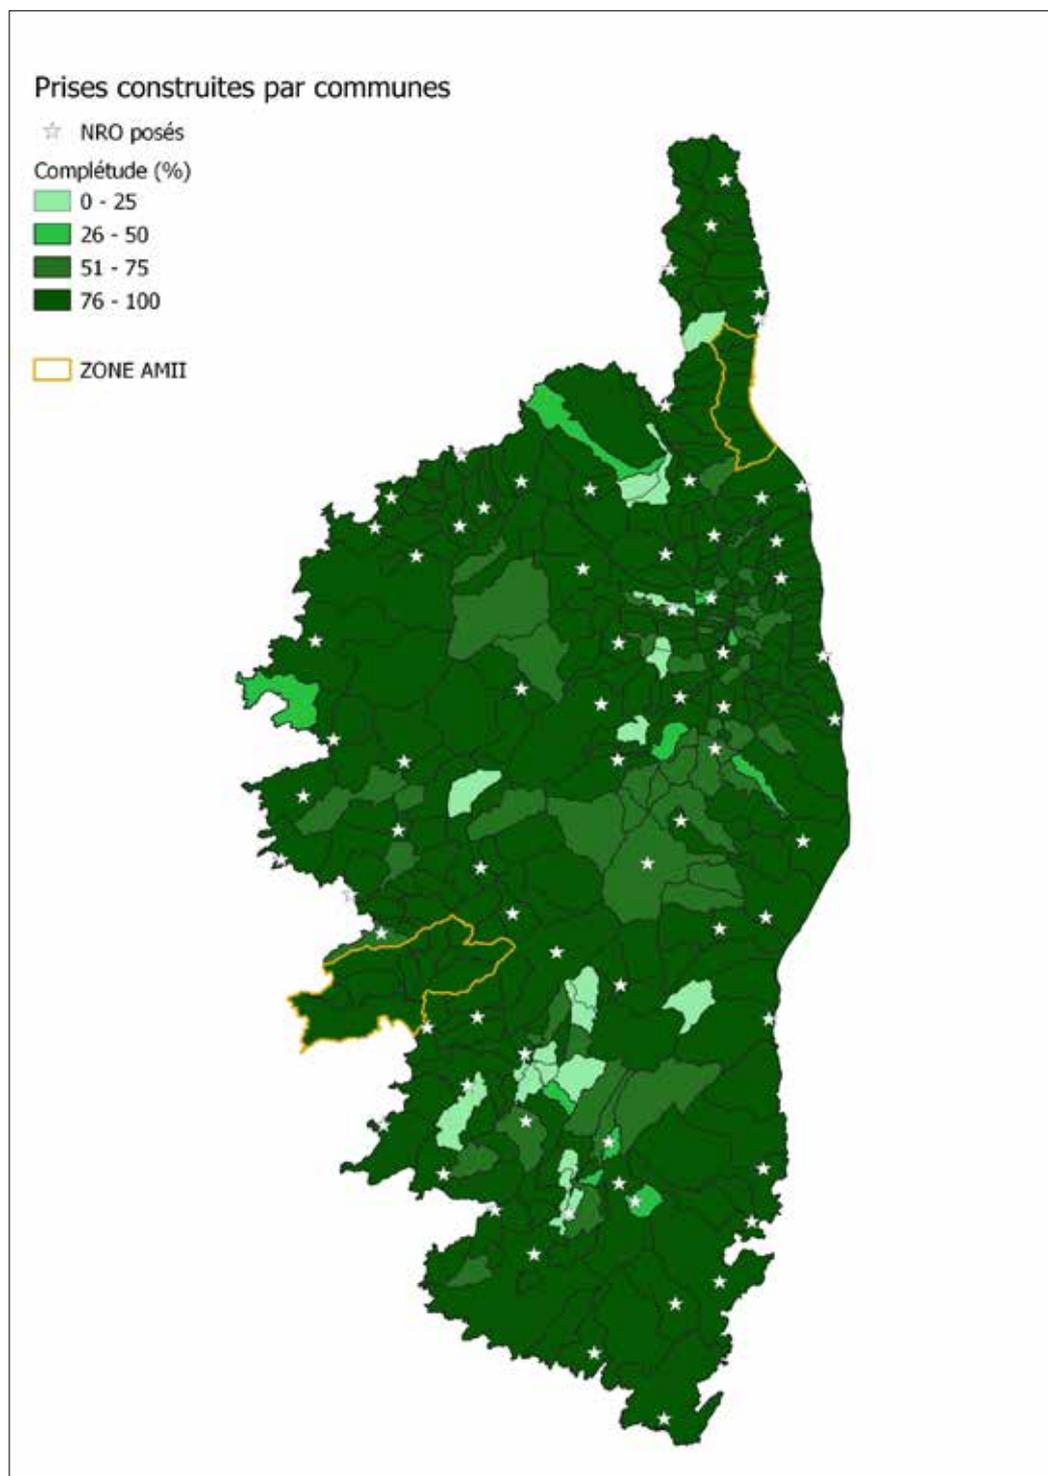


NOMBRE DE PRISES COMMERCIALISABLES PAR COMMUNE

Par convention, un «local commercialisable» ou une prise « commercialisable » désigne un local pour lequel il manque le seul raccordement final pour avoir une continuité optique entre le NRO et la prise terminale optique. Les prises déclarées comme «commercialisables» font l'objet d'un «gel» de la commercialisation à destination des usagers finaux pendant 3 mois. Passé ce délai légal, permettant une équité concurrentielle entre les opérateurs commerciaux (FAI), un usager est éligible aux offres fibre (FttH) et peut souscrire un abonnement auprès de tout opérateur proposant ses services sur le réseau. Un tableau relatif au calendrier de déploiement par communes est disponible en annexe du présent rapport. Le tableau présente notamment le nombre de prises construites et commercialisables par commune.

Au 31 décembre 2024, près de **170 900 prises** au total sont commercialisables, sur les **180 080 prises construites**.

BILAN DE LA SOUSCRIPTION D'ABONNEMENTS PAR LES USAGERS FINAUX

Sur plus de 170 900 prises commercialisables, plus de 68 000 prises ont fait l'objet de la souscription à un abonnement par des clients finaux auprès d'un fournisseur d'accès internet (FAI). On note **plusieurs centaines de nouveaux abonnements chaque mois**.

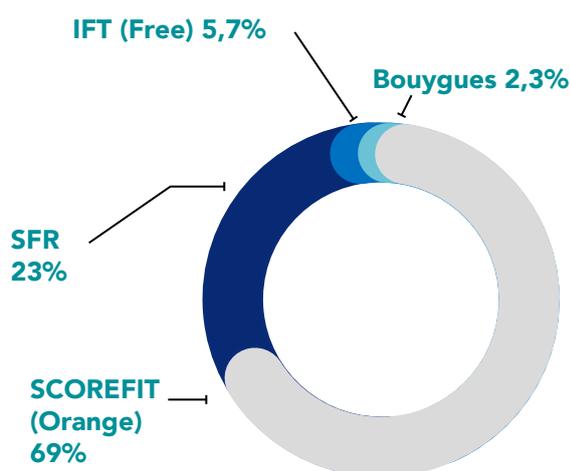

Les 4 opérateurs commerciaux grand public (Bouygues, Free, Orange et SFR) commercialisent leurs offres sur le réseau Corsica Fibra.

L'opérateur commercial (OC) **ORANGE** est le **plus actif** via sa filiale Scorefit (avec 69% des ventes d'abonnements), suivi de l'opérateur commercial (OC) SFR (23%). Free (5,7%) et Bouygues (2,3%) sont arrivés sur le réseau Corsica Fibra en début 2023.

TAUX DE PÉNÉTRATION DE MARCHÉ

Le taux de pénétration de marché est le rapport entre le nombre de prises éligibles à un abonnement FttH et le nombre d'abonnements FttH souscrits. Il peut donner un éclairage sur l'appétence des usagers pour les services fournis grâce au très haut débit fixe.

Sur le réseau de la DSP FttH, le taux de pénétration de marché « brut » est de 40%.

Cependant, les données INSEE en Corse permettent d'estimer à plus de 40% les logements identifiés comme résidences secondaires. Or, celles-ci ont un taux de souscription quasi nul aux abonnements FttH qui sont pour la plupart proposés au long cours (12 mois ou 24 mois).

Ainsi, en recalculant sur la base des locaux éligibles hors résidences secondaires, **nous pouvons évaluer le « taux de pénétration de marché net » à 68%**.

ADRESSAGE

La réalisation d'un plan d'adressage a pour objectif de disposer d'adresses normées sur une commune. Ce plan d'adressage recense la dénomination de l'ensemble des voies communales, publiques et privées et la numérotation de tous les bâtis (habitations, commerces, entreprises, sites publics, etc.) quel que soit leur état d'occupation.

Dans le cadre de sa mission d'appui aux communes, la Collectivité de Corse a engagé un travail structurant sur l'adressage, essentiel pour la valorisation du territoire en général, pour la sécurité, les services de secours, la distribution du courrier ou encore le développement du numérique.

En les accompagnant dans la mise en place d'une base d'adresses normées et géolocalisées, la Collectivité de Corse favorise un aménagement équilibré du territoire et améliore le quotidien des habitants. Des familles ont d'ores et déjà réinvesti les villages de façon pérenne du fait notamment de nouvelles possibilités de travail et autres usages numériques, via l'accès à l'internet à très haut débit.

Grâce à ce soutien financier, de nombreuses communes ont ainsi pu bénéficier d'une expertise précieuse pour moderniser et fiabiliser leur système d'adresses, garantissant ainsi une meilleure accessibilité et une reconnaissance officielle des lieux de vie, quartiers de villages ou hameaux (odonymie). Une attention particulière a été portée sur **la valorisation des toponymies locales**. Ce travail de recherche a entre autres permis de formaliser des usages et traditions orales menacés de dilution.

En Corse en 2020, plus de 90% des communes ne disposaient toujours pas d'un plan d'adressage, ou disposaient d'un plan d'adressage partiel.

La Collectivité de Corse a mis en place un Appel à Projets (AAP) relatif à l'adressage dès début 2021, initialement ouvert jusqu'en 2024 et financé par le fonds montagne*, permettant de soutenir les communes non seulement pour la réalisation de leur plan d'adressage, mais aussi la mise en place de la signalétique. Cet AAP a créé un effet levier permettant un développement accéléré de l'adressage et la maîtrise de leurs données par les communes.

Au 31 décembre 2024, 328 communes ont ainsi lancé un processus d'adressage dont :

- **231 ont transmis leur dossier d'AAP à la Collectivité de Corse ;**
- **226 ont clos leur adressage et l'ont publié sur la BAN (Base d'Adresse Nationale).**

Nota : Les dossiers continuent d'être instruits en attendant la révision prochaine du schéma d'aménagement, de développement, et de protection du massif, et sa mise en œuvre par le biais d'un nouveau règlement des aides. **Il est cependant préconisé aux communes faiblement et moyennement contraintes de solliciter des financements croisés.**

*le Schéma d'aménagement, de développement et de protection de la montagne couvrant la période 2017-2023 a été présenté aux élus de la montagne puis adopté par l'Assemblée de Corse le 24 février 2017 par la Délibération 17/050 AC.



Communes pour lesquelles une subvention a été attribuée

Afà	A Casanova	U Lugu di Nazza	Pianottuli è Caldareddu	Sant'Andria di Boziu
Aghjone	U Castellà di Casinca	Lumiu	I Piazzali	Sant'Andria di u Cotone
Aiti	U Castellà di Mercoriu	Luri	E Piazzole	Santa Riparata di Moriani
Alandu	Castellu di Rustinu	Marignana	Pedicorti di Caghju	Santu Petru di Tenda
Alata	Castifau	Matra	Pedicroce	San Petru di Venacu
Albitreccia	Castiglione	A Mazzola	Pedigrisgiu	Sari d'Urcinu
Aleria	Castirla	Mela	U Ped'Orezza	Sari di Sulinzara
Altiani	Centuri	Meria	A Petracurbara	Sarrula è Carcupinu
L'Alzi	Chjatra	Moita	A Petra di Verde	Sartè
Ambiegna	Chisà	Moltifau	Petralba	A Sarra di Farru
Antisanti	Coghja	A Munacia d'Orezza	Petraserena	Serra di Fiumorbu
Appiettu	Conca	Montegrossu	U Petricaghju	U Silvarecciu
Arburi	Currà	Munticellu	Pitrusedda	U Sulaghju
Aregnu	Corscia	Mursiglia	U Petrosu	Suddacarò
Arghjusta è Muricciu	Corti	E Muracciole	A Pieve	Surbuddà
Ascu	A Costa	Muratu	Pigna	Sorbu è Ocagnanu
Avapessa	Cuzzà	Muru	Pinu	Sotta
Balogna	E Cristinacce	Murzu	Piupeta	U Spiluncatu
Barbaghju	Cutulì è Curtichjatu	Nesce	Pioghjula	A Stazzona
Barrettali	Eccica è Suaredda	Nucariu	U Poghju di Nazza	Tagliu è Isulacciu
Bastelica	Ersa	Nuceta	U Poghju di Venacu	Talasani
A Bastilicaccia	Farringule	Nonza	U Poghju d'Oletta	Tarranu
Belvidè è Campumoru	U Favalellu	A Nuvale	U Pighjolu	Tavera
Biguglia	Felce	Ochjatana	U Poghju Marinacciu	Todda
Bilia	U Filicetu	Ogliastru	Poghju è Mezana	Tuminu
Bucugnà	Ficaghja	Olcani	Porri	Tocchisu
Bunifaziu	Foci è Bilzesi	Livesi	U Pratu di Ghjuvellina	Urtaca
Brandu	U Furciolu	Olmata di Capicorsu	I Prunelli di Fiumorbu	Vallecalle
Cagnanu	Fozzà	Olmata di Tuda	U Prunu	E Valli d'Alisgiani
Calacuccia	Gavignanu	Ulmetu	Quenza	A Valle di Campulori
Calcatoghju	A Ghisunaccia	Ulimiccia	U Quarcitellu	Valle di Rustinu
Calvi	Ghjucatoghju	Omessa	A Riventosa	A Valle d'Orezza
A Campana	A Grossa	L'Ortale	Ruglianu	Vilone è Urnetu
Campi	Grussettu è Prugna	Ortu	Ruspigliani	Venacu
Campu	Guargualè	Ota	Santa Lucia di Tallà	A Verdese
Canale di Verde	A Vuttera	Palasca	San Fiorenzu	Veru
Canari	L'Isulacciu di Fiumorbu	Palleca	U Salicetu	Vizzani
Carbini	A Porta	A Parata	Sampolu	Vicu
Carbuccia	Lama	Partinellu	San Damianu	Villanova
Carchetu è Brusticu	Lanu	Patrimoniu	San Gavinu d'Ampugnani	E Ville di Petrabugnu
Cardu è Torghja	Lecci	A Penta di Casinca	San Gavinu di Tenda	Vivariu
Carghjese	Letia	I Pirelli	San Ghjuvanni di Moriani	Zalana
U Carpinetu	Livia	Pitretu è Bicchisgià	San Ghjulianu	Zirubia
Casaglione	Lisula (Isula Rossa)	A Piana	San Lorenzu	Zevacu
Casalabriva	Linguizzetta	U Pianellu	Santa Maria di Lota	Zicavu
A Casalta	Lozzi	U Pianu	Santa Maria Poghju	Ziddara
				Zonza

APPEL A PROJET NUMERIQUE 2021 3133 APD (INVESTISSEMENT) Délibération n°21/073CP de l'Assemblée de Corse du 28/04/2021
Montant total des subventions attribuées : 2 544 198 €

POINT D'ÉTAPE SUR LE DÉPLOIEMENT ET LA COMMERCIALISATION DU RÉSEAU À TRÈS HAUT DÉBIT POUR LA CORSE ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2024 - 13 -

ÉLAGAGE

Dans le cadre du très haut débit, l'élagage permet de faciliter le déploiement du réseau en fibre optique par les opérateurs de communications électroniques. Ce réseau, par ailleurs amené à terme à être un bien de retour de la Collectivité de Corse, est désormais l'infrastructure de référence dans un contexte de fermeture progressive du réseau cuivre.

Pourtant, depuis le début des travaux de construction du réseau à très haut débit de la Corse, **les carences en termes d'élagage compromettent ou retardent le déploiement et fragilisent le réseau.** Si le retour d'expérience de la tempête d'août 2022 a montré une relativement bonne résilience des réseaux de fibre optique en aérien, il n'en reste pas moins que sur le moyen – long terme,

- l'usure liée aux aléas climatiques (tempêtes et vents notamment), en particulier sur les câbles, les traverses sur les poteaux, et les poteaux eux-mêmes,
- les besoins en termes d'exploitation des réseaux (FttH, Electricité, Cuivre, etc.),
- la prochaine extinction du réseau ADSL (cuivre) et la dépose des câbles afférents,
- Le passage des poids lourds qui arrachent parfois des branches et les câbles avec,
- etc.,


sont autant de sujets affectés par un élagage défaillant.

Si le chantier du très haut débit est proche d'être terminé, force est de constater que **sur de nombreux segments aériens, la végétation abondante fragilise les réseaux déployés et peut provoquer leur altération prématurée.**

Notons qu'au-delà de l'impact sur la fibre optique, l'élagage des arbres et arbustes en bord de route est une action déterminante pour la sécurité, la préservation des infrastructures et la protection de l'environnement. Il permet par exemple d'améliorer la visibilité pour les usagers, réduisant ainsi les risques d'accidents liés aux branches encombrantes ou aux chutes d'arbres en cas d'intempéries. Un élagage raisonné favorise par ailleurs la santé des arbres et préserve la biodiversité locale. Il contribue à l'embellissement du paysage et la valorisation du territoire tout en garantissant un équilibre entre sécurité et respect du patrimoine.

D'un point de vue juridique, **dans la plupart des cas le respect de la distance de chaque plantation du domaine public ou privé avec les lignes de communication aériennes n'est pas respecté** (cf. schéma ci-après). L'article L.51 du code des postes et des communications électroniques, introduit par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, distingue les rôles respectifs de ces acteurs. Cet article introduit une chaîne de responsabilité incitative entre propriétaires de terrains et exploitants de réseaux en matière d'entretien des abords des réseaux. Mais dans la majorité des cas le propriétaire est le premier responsable de l'entretien de son terrain, et **il est constaté de grandes difficultés dans l'application des règlements en la matière.**

Il est ainsi nécessaire que se mobilise l'ensemble des parties prenantes (propriétaires privés, propriétaires publics, mairies, communautés de communes, opérateurs, Collectivité de Corse) afin d'y apporter une solution dans laquelle chacun s'implique pour procéder aux opérations d'élagage.

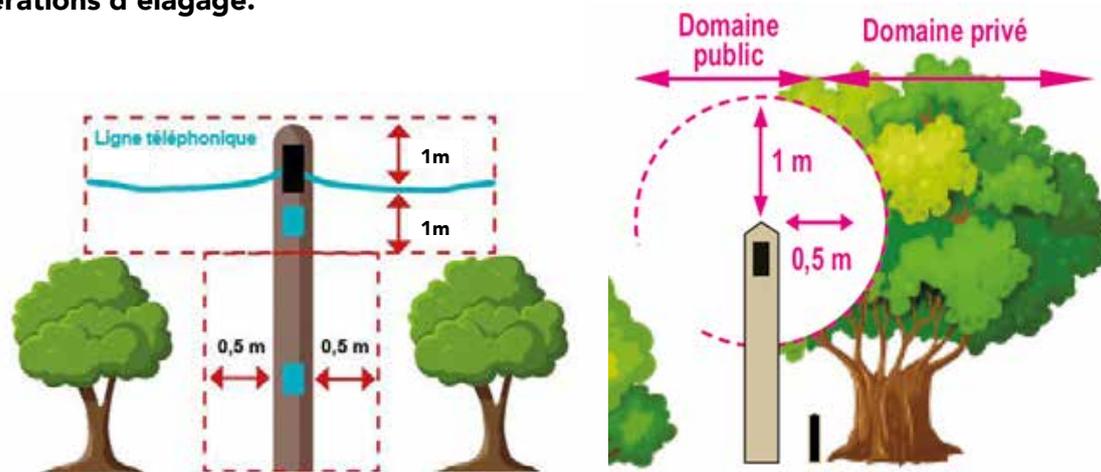

AUDITS ET CONTROLES DU RESEAU

Un marché à bons de commande est en cours d'exécution pour une assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) dans le cadre des projets d'infrastructures de télécommunications numériques, avec un lot dédié aux « prestations d'audit et de contrôle ».

Ces prestations, pour les 170.000 prises à construire, comprennent notamment l'accompagnement aux contrôles documentaires, aux contrôles des infrastructures livrées, et à la réception des travaux. Il s'agit d'une démarche industrielle ciblant l'ensemble des prises prévues au contrat.

Ces contrôles permettent aussi bien à la Collectivité de Corse de contrôler la qualité du réseau livré, en relevant entre autres les éventuelles réfections à réaliser, qu'au délégataire Corsica Fibra de proposer et mettre en œuvre un plan de reprise adéquat.

En effet, au 31 décembre 2024,

- plus de 350 zones techniques (ZAPM - Zone Arrière de Point de Mutualisation) sélectionnées par échantillonnage représentatif sur tout le territoire ont d'ores et déjà été auditées.
- Près de 30 000 tickets ont été produits, soit au contrôle concernant plus de 100 000 prises.

Une démarche de collaboration avec le délégataire a permis :

- de corriger les défauts de plus de 210 zones et de produire les P.V. de recette ;
- la levée de réserves, par le délégataire de manière proactive sur des zones non encore contrôlées ;
- la prise en considération des bonnes pratiques pour assurer que les nouvelles zones à construire soient livrées avec le minimum de réserves.

Les données d'audit sont ainsi intégrées dans différents systèmes d'information permettant tout autant les levées de réserves que le pilotage des audits.


Ces éléments permettent également la sécurisation des P.V. de recettes ainsi que le processus de réception du réseau.

POINT FINANCIER

VERSEMENT DE LA SUBVENTION AU DÉLÉGATAIRE

Au 31 décembre 2024, 49% de la subvention a été versée par la Collectivité de Corse au délégataire Corsica Fibra.

Montant total de la subvention publique alloué : 52 000 000 €

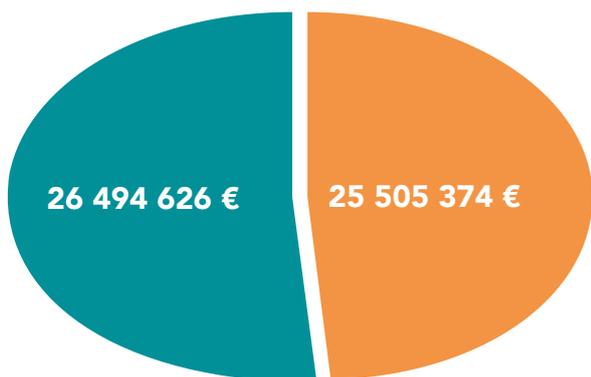

Les subventions sont versées au fur et à mesure de la réception par la Collectivité de Corse des livrables attestant la construction du réseau.

- Reste à verser
- Montant total de la subvention versée

PART DES VERSEMENTS FSN ET PEI PERÇUE PAR LA CDC

La Collectivité de Corse a perçu **15 742 512 €** de versement du FSN. Une demande de subventions FSN est prévue dans le courant du 1^{er} semestre 2025.

Par ailleurs, la Collectivité de Corse a perçu un total de versement du PEI pour un montant de **3 138 434 €** et une demande de **208 720 €** est en cours d'instruction.

PART DES REDEVANCES POUR FRAIS DE CONTRÔLE PERÇUE PAR LA COLLECTIVITÉ DE CORSE

Au titre de l'article 28.3 de la Convention portant sur les redevances de contrôle, la Collectivité de Corse perçoit annuellement une somme de 75 000 € de Corsica Fibra (indexés au taux fixe de 1,80%) pour la première phase de déploiement (pour la période 2024-2045).

Au 31 décembre 2024, la Collectivité de Corse a perçu **874 958 €** de redevances.

Montant total de redevance alloué : 4 775 431 €

874 958 €



- Reste à verser
- Montant de redevance versée

Les paiements sont à jour.

POINT D'ÉTAPE

FORMATION, INSERTION ET EMPLOI

Conformément à l'article « 4.8. Mise en œuvre d'une politique favorisant l'insertion par l'emploi et la formation » de la convention, le délégataire est tenu de poursuivre une politique favorisant la formation professionnelle ainsi que l'insertion sociale et professionnelle.

Malgré les crises sanitaires qui se sont succédées depuis début 2020, plus de 60 000 heures de formation ont été dispensées.

Elles ont permis de former et diplômer **297 apprentis**.

253 apprentis ont obtenu un CDI, soit **91% des diplômés**.

18 sessions de formation ont été dispensées depuis 2019, dans le contexte de la pandémie, en partenariat avec l'Afpa de Corti et le CFA de Corse du sud.

62 590 heures de formation et 66 430 heures d'insertion ont été dispensées depuis le début du projet.

Synthèse	Objectifs vs Réalisé	Objectif convention à T0 + 5 ans = fin 2023 (Nb d'heures)	Nb d'heures réalisées au 1 ^{er} mars 2023 (début exercice 5)	% réalisé au 01/03/2023 (début exercice 5) Vs Objectifs à T0 + 5 ans (fin 2023)	Objectif total convention (Nb d'heures)	% réalisé au 01/03/2023 vs objectif total convention (fin 2044)
	Formation	23 205	62 590	270 %	30 823	203%
	Insertion	57 450	66 430	116 %	95 727	69 %

En termes d'heures de formation, plus du double des objectifs contractuels (à réaliser avant fin 2044) ont d'ores et déjà été réalisés.

Concernant les heures d'insertion, près de 70% de l'objectif à fin 2044 est d'ores et déjà réalisé. De nouveaux programmes sont à l'étude pour atteindre les objectifs contractuels à terme.

POINT D'ÉTAPE SUR LE NUMÉRIQUE INCLUSIF ET LE DÉVELOPPEMENT DES USAGES

1. DIGITAL FACTORY IN PAESI

En 2022, à mi-parcours du déploiement, la Collectivité de Corse et Corsica Fibra ont décidé de lancer une action à destination des citoyens résidant dans les territoires ruraux. Cette action a consisté à accompagner les corses dans les nouveaux usages permis par la fibre. Portée par Corsica Fibra, en partenariat avec la Collectivité de Corse et les Communautés de Communes, cette initiative visait à offrir à tous les publics une meilleure compréhension et utilisation des outils numériques.

L'opération **Digital Factory in Paesi** s'est terminée avec sa 17^{ème} édition à Luri le 22 juin 2024. De décembre 2022 à juin 2024, **17 journées d'inclusion numérique au sein des 17 EPCI** de Corse ont été organisées suivant le calendrier prévisionnel de l'arrivée de la fibre, à travers diverses communes de l'île, à raison d'un samedi par mois.


L'Isula	03/12/2022	Venacu	17/06/2023	Patrimoniu	17/02/2024
U Borgu	21/01/2023	I Fulelli	23/09/2023	A Ghisunaccia	13/04/2024
Sotta	04/02/2023	Pitretu è Bicchisgià	28/10/2023	Vicu	27/04/2024
Grussettu è Prugna	18/03/2023	Lumiu	18/11/2023	Tavera	01/06/2024
Calacuccia	15/04/2023	Santa Lucia di Tallà	09/12/2023	Luri	22/06/2024
Santa Lucia di Moriani	20/05/2023	Aleria	27/01/2024		

Chaque journée comprenait des ateliers de découverte des usages numériques, des sessions de prévention et des permanences de conseillers numériques. Elles ont attiré un large public, des enfants aux seniors, démontrant un réel engouement. Les ateliers ont permis à de nombreux participants d'acquérir de nouvelles compétences, renforçant ainsi leur autonomie dans l'utilisation des technologies. Les sessions de prévention ont aidé les parents à mieux comprendre les enjeux liés à l'utilisation d'internet par leurs enfants, favorisant une approche plus sécurisée du numérique. Au total, 2 230 personnes ont participé aux événements.

Comme le définit la stratégie « **Smart Isula** » (adoptée par l'Assemblée de Corse le 2 juin 2022), le projet a participé à faire de la Corse une île inclusive au sein de laquelle chacun peut trouver sa place, développer ses capacités d'agir et transformer la société. L'opération **Digital Factory in Paesi** illustre **une réponse innovante à la problématique d'inclusion numérique** des citoyens habitants dans les territoires ruraux.



2. EVENEMENT TERRITORI DI DUMANE

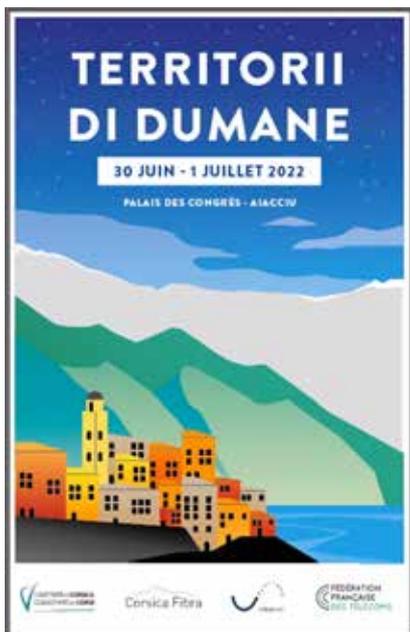


La deuxième édition de **Territorii di Dumane** s'est tenue au Palais des Congrès d'Ajaccio les 22 et 23 juin 2023. Ayant pour thématique « L'autonomie et la résilience », cet événement d'envergure nationale a été coorganisé par la Collectivité de Corse, Corsica Fibra et sa maison mère XP Fibre, la Fédération Française des Télécoms (FFT) qui réunit les opérateurs de communications électroniques en France, et la Filière InfraNum qui regroupe plus de 200 entreprises du secteur des télécommunications.

Avec plus de 150 participants, cet événement a une fois de plus suscité un véritable engouement et a notamment permis de dresser le bilan des projets, discuter des difficultés rencontrées, définir collectivement les solutions permettant de les surmonter et présenter les perspectives à venir à court, moyen et long terme.

L'évènement « Territorii di Dumane » s'inscrit pleinement dans les projets numériques de la Corse, qu'il s'agisse du déploiement du réseau haut débit et très haut débit, de la couverture des zones blanches de téléphonie mobile et du New Deal Mobile ou encore du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique de Corse « Smart Isula ».

Unique en son genre au niveau national, le succès des éditions 2022 et 2023 ont poussé la Collectivité de Corse et son délégataire à pérenniser ce type d'évènement en organisant **E Ghjurnate Smart Isula, Cybersécurité, Intelligence Artificielle et Data** les mercredi 22 et jeudi 23 mai au Palais des Congrès d'Ajaccio.

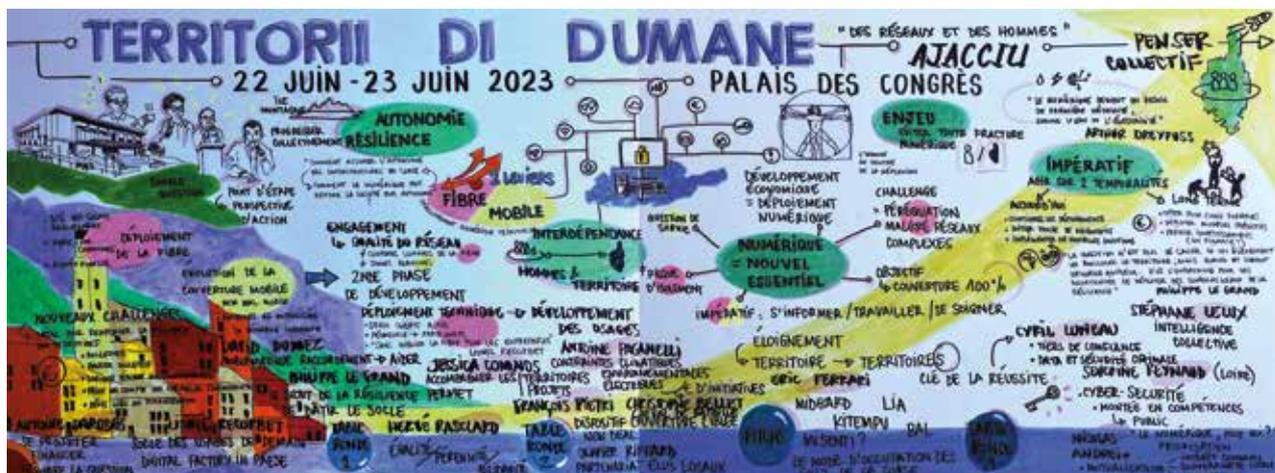

Plus d'information : <https://www.isula.corsica/territoriidumane>

3. E GHJURNATE SMART ISULA DES 22 ET 23 MAI 2024

Le numérique est essentiel à notre quotidien, que nous soyons une entreprise, une collectivité, une association ou un citoyen. Nous utilisons tous massivement des outils digitaux, générant et stockant d'importantes quantités de données, souvent cruciales, personnelles voire confidentielles.

Le projet **E Ghjurnate Smart Isula, Cybersécurité, Intelligence Artificielle et Data** consiste en un cycle de conférences, d'échanges et d'ateliers. Animés par des experts des domaines traités, ces moments planifiés sur 2 jours donnent des clefs aux entreprises et aux collectivités corses pour leur permettre d'utiliser le plein potentiel de l'IA et de la Data sur le territoire, tout en se prémunissant du risque cyber.

Après la réussite des éditions 2022 et 2023 de l'événement **Territorii di Dumane**, Corsica Fibra avec le soutien de XpFibre et de la Collectivité de Corse a donc organisé « **E Ghjurnate** » les mercredi 22 et jeudi 23 mai 2024 au Palais des Congrès d'Aiacciu.


Ces deux journées se sont inscrites dans la promotion des usages numériques dans le cadre de la stratégie Smart Isula et des services attendus par le déploiement du réseau à très haut débit de la Corse.

Le programme a été le suivant :

- le mercredi 22 mai : Ateliers et conférences de sensibilisation aux bonnes pratiques et mesures de sécurité numérique élémentaires. L'occasion notamment de découvrir le rôle et les services du **CSIRT CyberCorsica** (Computer Security Incident Response Team).
- le jeudi 23 mai : Ateliers et conférences sur l'utilisation vertueuse de la Data et de l'IA dans les organisations & réflexion sur la feuille de route **d'un service public de la donnée en Corse**.

Au total 278 personnes ont assisté aux deux journées.

Plus d'informations : <https://ambizionedigitale.isula.corsica/videos-e-ghurnate-smart-isula/>



CONCERTATION

CDC – CORSICA FIBRA

La concertation entre la Collectivité de Corse et Corsica Fibra est quotidienne.

Elle est ponctuée mensuellement de comités de suivi et annuellement de comités stratégiques.

Au 31 décembre 2024, 34 comités de suivi et 9 comités de pilotage se sont tenus.

Tel que le stipule l'« article 39 - **COMITE DE SUIVI** » de la convention de DSP FTTH, un comité de suivi de la Délégation a été constitué. Ce comité est composé de représentants du Délégrant et du Délégataire. Chacun de ces représentants pourra être accompagné de toutes personnes qu'il jugera utile de s'adjoindre pour les besoins de cette réunion.

Le comité de suivi aura notamment pour objet de :

- suivre l'exécution des différentes phases de conception, de construction et d'exploitation du réseau afin de s'assurer du respect des stipulations de la Convention ;
- proposer au Délégataire et au Délégrant les améliorations pouvant être apportées aux conditions d'exploitation du Réseau ;
- échanger les informations nécessaires à la bonne exécution de la présente Convention ;
- apprécier le catalogue de Services et son évolution ;
- faire le bilan des actions d'animation et/ou de contribution au développement économique du territoire menées par le Délégataire en partenariat avec le Délégrant ou tout autre acteur intéressé au projet ;
- étudier les données financières à date, notamment s'agissant du calcul de la redevance de mise à disposition, et les perspectives à court et moyen terme ;
- faire le point sur l'intéressement du Délégrant aux résultats de l'exploitation.

Par ailleurs, tel que le stipule l'« article 40 - **COMITE DE PILOTAGE** » de la convention de DSP FTTH, le comité de pilotage (ou comité stratégique) est une instance stratégique composée à parité de représentants du Délégrant et du Délégataire.

GLOSSAIRE /OU FAQ



Que signifie FTTH ?

FTTH (Fiber to the home) est l'acronyme anglais qui signifie « fibre jusqu'au domicile ». Avec le FTTH, le logement est directement raccordé par une fibre optique à Internet. Une fibre est tirée entre le nœud de raccordement optique (NRO) et l'intérieur du logement pour être raccordée à un équipement de type « Box ».

Qu'est qui caractérise le Très Haut Débit (THD) ?

L'accès à Internet est considéré à « Très Haut Débit » dès que le débit est supérieur à 30 Mégabits par seconde (définition de l'autorité de régulation des télécommunications, l'ARCEP).

Qu'est-ce qu'un RIP ?

Un RIP désigne un Réseau de télécommunications d'Initiative Publique. La Collectivité de Corse porte aujourd'hui deux Réseaux de télécommunication d'Initiative Publique. En 2005, elle confie son RIP de première génération pour le haut débit à ORANGE et à la société Corsica Haut Débit. En 2018 elle confie son RIP de deuxième génération pour le très haut débit à XpFibre et à la société Corsica Fibra.

Qu'est-ce qu'un NRO ?

Le nœud de raccordement optique est, dans un réseau de fibre optique, le point où convergent les liaisons optiques d'un même quartier ou d'une même ville. Il est également le point depuis lequel partent les réseaux FTTH en direction des logements ou entreprises raccordés.

Qu'est-ce qu'un PM ?

Dans le déploiement d'un réseau de fibre optique, le premier maillon de la chaîne est constitué du Nœud de Raccordement Optique (NRO). Le deuxième maillon de la chaîne en se rapprochant du logement c'est le Point de Mutualisation (PM). Après le PM arrive au plus proche à l'extérieur des habitations le PBO (Point de Branchement Optique).

Qu'est-ce qu'une Zone AMII (Appel à manifestation d'Intérêt d'investissement) ?

Il s'agit de territoires dans lesquels les opérateurs de télécommunications privés se sont engagés à réaliser à leurs frais un réseau FTTH. En Corse, deux zones AMII opérées par l'opérateur Orange sont déclarées, la première concerne la Communauté d'agglomération du Pays Ajacciens, la deuxième la Communauté d'agglomération de Bastia et la commune de Biguglia.

Qu'est-ce que la Fibre Optique ?

Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique, plus fin qu'un cheveu, qui conduit la lumière. Le signal lumineux injecté dans la fibre est capable de transporter de grandes quantités de données à la vitesse de la lumière sur plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres. La fibre optique est utilisée depuis plus de vingt ans notamment pour le transport de données entre les grandes agglomérations. Son extension jusqu'aux logements via le FTTH va permettre de répondre aux besoins croissants en débits et en services des particuliers et des entreprises.

ANNEXE

CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT PAR COMMUNE

—◆—
(Données à jour du 31/12/2024)

COMMUNE D'IMPLANTATION	LOCU (COMMUNES CONCERNÉES)	NB DE PRISES CIBLE	NB DE PRISES CONSTRUITES	NB DE PRISES COMMERCIALISABLES	ANNÉES DE DÉPLOIEMENT
Aghione	Aghjone	124	132	132	2023
Aiti	Aiti	87	108	14	2023
Alando	Alandu	52	40	40	2023
Albertacce	Albertacce	445	397	397	2024
Albitreccia	Albitreccia	1511	1623	1623	2019
Aléria	Aleria	1093	1513	1513	2021
Algajola	L'Algaiola	740	582	582	2021
Altagène	Altaghjè	69	29	0	2024
Altiani	Altiani	148	111	0	2024
Alzi	L'Alzi	27	29	29	2024
Ambiegna	Ambiegna	38	36	36	2024
Ampriani	Ampriani	24	28	28	2023
Antisanti	Antisanti	417	358	358	2023
Arbellara	Arbiddali	142	147	147	2022
Arbori	Arburi	106	72	72	2024
Aregno	Aregnu	617	671	671	2022
Argiusta-Moriccio	Arghjusta è Muricciu	181	54	54	2023
Arro	Arru	92	84	84	2024
Asco	Ascu	251	169	0	2024
Aullène	Auddè	540	319	0	2023
Avapessa	Avapessa	107	100	100	2022
Azilone-Ampaza	Azilonu è Ampaza	153	0	0	2024
Azzana	Azzana	136	114	114	2024
Balogna	Balogna	197	265	3	2024
Barbaggio	Barbaghju	165	222	222	2021
Barrettali	Barrettali	334	279	279	2024
Bastelica	Bastelica	862	753	753	2024
Bastelicaccia	A Bastilicaccia	2230	2464	2464	2019
Belgodère	Belgudè	634	802	802	2021
Belvédère-Campomoro	Belvidè è Campumoru	400	360	360	2021
Bigorno	Bigornu	114	114	114	2024
Bilia	Bilia	73	83	83	2022
Bisinchi	Bisinchi	236	207	207	2023
Bocognano	Bucugnà	605	509	509	2022
Bonifacio	Bunifaziu	3391	2976	2976	2021
Borgo	U Borgu	4926	5904	5904	2019
Brando	Brandu	1258	1633	1633	2022
Bustanico	Bustanicu	81	63	63	2024

COMMUNE D'IMPLANTATION	LOCU (COMMUNES CONCERNÉES)	NB DE PRISES CIBLE	NB DE PRISES CONSTRUITES	NB DE PRISES COMMERCIALISABLES	ANNÉES DE DÉPLOIEMENT
Cagnano	Cagnanu	349	302	297	2022
Calacuccia	Calacuccia	486	470	470	2023
Calcatoggio	Calcatoghju	1022	748	748	2024
Calenzana	Calinzana	1628	2167	2148	2021
Calvi	Calvi	5482	6710	6710	2022
Cambia	Cambia	127	128	0	2023
Campana	A Campana	71	49	49	2023
Campi	Campi	45	34	34	2023
Campile	Campile	318	264	264	2023
Campitello	Campitellu	127	104	104	2023
Campo	Campu	136	102	102	2023
Canale-di-Verde	Canale di Verde	314	368	368	2021
Canari	Canari	564	596	596	2023
Canavaggia	A Canavaghja	169	182	182	2024
Cannelle	I Canneddi	70	59	59	2024
Carbini	Carbini	204	60	0	2022
Carbuccia	Carbuccia	253	226	226	2022
Carcheto-Brustico	Carchetu è Brusticu	86	70	70	2023
Cardo-Torgia	Cardu è Torghja	31	6	6	2024
Cargèse	Carghjese	1539	1461	1461	2022
Cargiaca	Carghjaca	99	11	0	2024
Carpineto	U Carpinetu	65	56	56	2023
Carticasi	Carticasi	93	66	0	2023
Casabianca	A Casabianca	78	44	0	2023
Casaglione	Casaglione	692	662	659	2023
Casalabriva	Casalabriva	210	203	203	2022
Casalta	A Casalta	56	48	48	2021
Casamaccioli	Casamacciuli	253	201	201	2024
Casanova	A Casanova	284	273	273	2022
Casevecchie	E Casevechje	62	56	56	2022
Castellare-di-Casinca	U Castellà di Casinca	437	495	495	2021
Castellare-di-Mercurio	U Castellà di Mercuriu	56	59	59	2023
Castello-di-Rostino	Castellu di Rustinu	362	371	371	2023
Castifao	Castifau	255	236	236	2023
Castiglione	Castiglione	70	79	79	2022
Castineta	Castineta	73	12	0	2023
Castirla	Castirla	154	160	160	2024

COMMUNE D'IMPLANTATION	LOCU (COMMUNES CONCERNÉES)	NB DE PRISES CIBLE	NB DE PRISES CONSTRUITES	NB DE PRISES COMMERCIALISABLES	ANNÉES DE DÉPLOIEMENT
Cateri	I Catari	226	231	231	2022
Cauro	Cavru	754	1026	1026	2022
Centuri	Centuri	469	396	0	2024
Cervione	Cervioni	1347	1740	1740	2021
Chiatra	Chjatra	230	198	198	2021
Chisa	Chisà	130	0	0	2023
Ciamannacce	Ciamanaccia	148	178	178	2024
Coggia	Coghja	792	761	761	2024
Cognocoli-Monticchi	Cugnoculu è Muntichji	211	49	0	2022
Conca	Conca	1418	1315	755	2022
Corbara	A Curbaghja	1262	1369	1368	2020
Corrano	Currà	128	88	88	2023
Corscia	Corscia	367	265	265	2023
Corte	Corti	4831	5624	5617	2020
Costa	A Costa	96	90	90	2021
Coti-Chiavari	Coti Chjavari	1252	1172	1172	2022
Cozzano	Cuzzà	336	336	336	2023
Cristinacce	E Cristinacce	130	105	105	2023
Croce	A Croce	106	92	92	2023
Crocicchia	A Crucichja	97	78	0	2023
Eccica-Suarella	Eccica è Suared-da	532	693	691	2021
Erbajolo	Erbaghjolu	123	45	0	2024
Érone	Erone	24	2	0	2023
Ersa	Ersa	363	389	0	2024
Evisa	Evisa	442	351	351	2023
Farinole	Farringule	266	269	269	2022
Favalello	U Favalellu	49	52	52	2023
Felce	Felge	82	78	78	2023
Feliceto	Filicetu	223	231	225	2022
Ficaja	Ficaghja	97	95	95	2023
Figari	Figari	1135	1399	1399	2021
Foce	Foci è Bilzesi	154	162	162	2021
Focicchia	Fughjichja	61	40	0	2024
Forciolo	U Furciolu	86	0	0	2022
Fozzano	Fozzà	195	153	153	2021
Frasseto	Frassetu	199	139	139	2023
Galéria	Galeria	500	493	475	2023
Gavignano	Gavignanu	109	60	0	2023
Ghisonaccia	A Ghisunaccia	2264	3158	3158	2021

COMMUNE D'IMPLANTATION	LOCU (COMMUNES CONCERNÉES)	NB DE PRISES CIBLE	NB DE PRISES CONSTRUITES	NB DE PRISES COMMERCIALISABLES	ANNÉES DE DÉPLOIEMENT
Ghisoni	Ghisoni	613	395	394	2023
Giocatojo	Ghjucatoghju	59	52	0	2024
Giuncaggio	Ghjuncaghju	92	63	0	2022
Giuncheto	Ghjunchetu	94	111	111	2021
Granace	Granaccia	114	114	114	2021
Grossa	A Grossa	127	87	87	2021
Grosseto-Prugna	Grussettu è Prugna	3266	4338	4336	2019
Guagno	Guagnu	330	192	1	2022
Guargualé	Vargualè	125	106	0	2024
Guitera-les-Bains	A Vuttera	192	44	0	2023
Isolaccio-di-Fiumorbo	L'Isulacciu di Fiumorbu	458	356	326	2024
La-Porta	A Porta	193	230	230	2023
Lama	Lama	36	27	0	2024
Lano	Lanu	238	212	8	2023
Lavatoggio	Lavatoghju	157	171	171	2022
Lecci	Lecci	1870	2480	2430	2022
Lento	Lentu	179	143	143	2024
Letia	Letia	354	326	326	2024
Levie	Livia	833	716	626	2022
L'Île-Rousse	L'Isula	3620	3952	3939	2020
Linguizzetta	Linguizzetta	1199	1487	1487	2022
Lopigna	Lopigna	184	147	147	2024
Loreto-di-Casinca	Loretu di Casinca	252	251	250	2022
Loreto-di-Tallano	Laretu d'Attallà	89	18	0	2024
Lozzi	Lozzi	336	293	293	2024
Lucciana	Lucciana	3580	4494	4485	2019
Lugo-di-Nazza	U Lugu di Nazza	104	62	7	2023
Lumio	Lumiu	2649	2487	2472	2021
Luri	Luri	912	864	864	2022
Manso	U Mansu	153	159	159	2023
Marignana	Marignana	281	201	13	2024
Matra	Matra	85	98	98	2023
Mausoléo	U Musuleu	41	30	30	2022
Mazzola	A Mazzola	60	51	51	2023
Mela	Mela	62	50	50	2023
Meria	Meria	246	206	206	2023
Moca-Croce	Macà è Croci	278	268	268	2023
Moïta	Moita	146	118	118	2021
Moltifao	Moltifau	664	636	636	2022

COMMUNE D'IMPLANTATION	LOCU (COMMUNES CONCERNÉES)	NB DE PRISES CIBLE	NB DE PRISES CONSTRUITES	NB DE PRISES COMMERCIALISABLES	ANNÉES DE DÉPLOIEMENT
Monacia-d'Aullène	A Munacia d'Auddè	673	617	617	2021
Monacia-d'Orezza	A Munacia d'Orezza	67	50	50	2023
Moncale	U Mucale	207	259	259	2022
Monte	Monte	361	443	443	2021
Montegrosso	Montegrossu	415	477	477	2023
Monticello	Munticellu	1528	1763	1751	2020
Morosaglia	Merusaglia	771	722	567	2023
Morsiglia	Mursiglia	296	366	0	2023
Muracciole	E Muracciole	82	60	60	2023
Murato	Muratu	510	481	0	2023
Muro	Muru	344	340	340	2022
Murzo	Murzu	151	151	150	2024
Nessa	Nesce	152	136	136	2022
Nocario	Nucariu	108	95	95	2023
Noceta	Nuceta	107	61	0	2023
Nonza	Nonza	176	151	151	2024
Novale	A Nuvale	75	70	70	2023
Novella	Nuvella	131	115	115	2020
Ocana	Ocana	413	428	428	2020
Occhiatana	Ochjatana	319	321	321	2021
Ogliastro	Ogliastru	178	151	151	2024
Olcani	Olcani	84	82	82	2024
Oletta	Oletta	945	1397	1397	2021
Olivese	Livesi	310	27	0	2022
Olmeta-di-Capocorso	Olmeta di Capicorsu	184	0	0	2024
Olmeta-di-Tuda	Olmeta di Tuda	229	296	20	2023
Olmeto	Ulmetu	1501	1216	1215	2023
Olmi-Cappella	Olmi è Cappella	280	260	260	2021
Olmiccìa	Ulimiccìa	102	0	0	2023
Olmo	L'Olmu	150	109	108	2024
Omessa	Omessa	564	510	510	2023
Ortale	L'Ortale	67	51	51	2022
Ortiporio	Ortiporiu	135	116	0	2024
Orto	Ortu	133	126	0	2022
Osani	Osani	173	84	0	2024
Ota	Ota	671	799	799	2023
Palasca	Palasca	230	288	288	2020
Palneca	Palleca	257	240	240	2024

COMMUNE D'IMPLANTATION	LOCU (COMMUNES CONCERNÉES)	NB DE PRISES CIBLE	NB DE PRISES CONSTRUITES	NB DE PRISES COMMERCIALISABLES	ANNÉES DE DÉPLOIEMENT
Pancheraccia	A Pancheraccia	173	83	0	2022
Parata	A Parata	61	34	34	2023
Partinello	Partinellu	194	206	7	2024
Pastricciola	A Pastricciola	288	228	228	2024
Patrimonio	Patrimoniu	642	637	637	2021
Penta-Acquatella	A Penta è Acquatella	53	43	0	2023
Penta-di-Casinca	A Penta di Casinca	2261	2610	2585	2021
Perelli	I Pirelli	84	77	77	2024
Pero-Casevecchie	Peru è Casevecchie	156	149	149	2021
Petreto-Bicchisano	Pitretu è Bicchisgià	637	470	470	2022
Piana	A Piana	664	540	540	2024
Pianello	U Pianellu	143	119	119	2023
Piano	U Pianu	49	39	39	2021
Pianottoli-Caldareello	Pianottuli è Caldareddu	901	883	883	2022
Piazzali	I Piazzali	30	24	24	2024
Piazzole	E Piazzole	54	55	55	2023
Piedicorte-di-Gaggio	Pedicorti di Caghju	240	140	0	2022
Piedicroce	Pedicroce	162	138	138	2023
Piedigriggio	Pedigrisgiu	123	173	173	2023
Piedipartino	U Pedipartinu	29	26	26	2023
Pie-d'Orezza	U Pe' d'Orezza	83	75	75	2023
Pietracorbara	A Petracurbara	635	688	688	2022
Pietra-di-Verde	A Petra di Verde	216	177	177	2021
Pietralba	Petralba	398	462	462	2023
Pietraserena	Petraserena	135	87	0	2024
Pietricaggio	U Petricaghju	71	52	52	2023
Pietrosella	Pitrusedda	1416	1866	1866	2022
Pietroso	U Petrosu	291	328	328	2023
Piève	A Pieve	129	25	1	2022
Pigna	Pigna	128	115	115	2022
Pila-Canale	Pila è Canali	313	272	0	2022
Pino	Pinu	259	267	267	2023
Piobetta	Piupeta	57	47	47	2023
Pioggiola	Pioghjula	169	135	135	2022
Poggio-di-Nazza	U Poghju di Nazza	250	183	0	2024

COMMUNE D'IMPLANTATION	LOCU (COMMUNES CONCERNÉES)	NB DE PRISES CIBLE	NB DE PRISES CONSTRUITES	NB DE PRISES COMMERCIALISABLES	ANNÉES DE DÉPLOIEMENT
Poggio-di-Venaco	U Poghju di Venacu	190	46	1	2024
Poggio-d'Oletta	U Poghju d'Oletta	190	187	186	2021
Poggiolo	U Pighjolu	159	179	0	2022
Poggio-Marinaccio	U Poghju Marinacciu	40	19	0	2023
Poggio-Mezzana	Poghju è Mezana	942	981	980	2021
Polveroso	U Pulverosu	57	40	40	2023
Popolasca	U Pulascu	75	67	67	2022
Porri	Porri	74	62	62	2022
Porto-Vecchio	Portivechju	11998	13680	13549	2021
Prato-di-Giovellina	U Pratu di Ghjuvellina	94	103	103	2024
Propriano	Prupìa	3178	3743	3743	2020
Prunelli-di-Casacconi	I Prunelli di Casacconi	190	158	158	2024
Prunelli-di-Fiumorbo	I Prunelli di Fiumorbu	2049	2848	2847	2021
Pruno	U Prunu	169	145	144	2021
Quasquara	Quasquara	100	78	0	2024
Quenza	Quenza	721	459	459	2023
Quercitello	U Quarcitellu	69	34	0	2023
Rapaggio	Rapaghju	164	47	47	2023
Rapale	Rapale	150	127	7	2024
Renno	Rennu	266	193	0	2023
Rezza	Reza	129	102	102	2024
Riventosa	A Riventosa	175	141	114	2024
Rogliano	Ruglianu	856	824	824	2024
Rosazia	Rusazia	152	136	136	2023
Rospigliani	Ruspigliani	117	80	0	2024
Rusio	Rusiu	98	0	0	2024
Rutali	Rutali	273	188	0	2024
Sainte-Lucie-de-Tallano	Santa Lucia di Tallà	635	445	352	2023
Saint-Florent	San Fiurentu	414	374	374	2021
Salice	U Salge	1753	1843	1843	2023
Saliceto	U Salgetu	166	160	160	2023
Sampolo	Sampolu	83	70	4	2024
San-Damiano	San Damianu	137	104	104	2022
San-Gavino-d'Ampugnani	San Gavinu d'Ampugnani	87	51	51	2021

COMMUNE D'IMPLANTATION	LOCU (COMMUNES CONCERNÉES)	NB DE PRISES CIBLE	NB DE PRISES CONSTRUITES	NB DE PRISES COMMERCIALISABLES	ANNÉES DE DÉPLOIEMENT
San-Gavino-di-Carbini	San Gavinu di Carbini	141	80	80	2024
San-Gavino-di-Fiumorbo	San Gavinu di Fiumorbu	828	980	974	2024
San-Gavino-di-Tenda	San Gavinu di Tenda	222	204	204	2022
San-Giovanni-di-Moriani	San Ghjuvanni di Muriani	78	36	0	2022
San-Giuliano	San Ghjulianu	123	116	116	2021
San-Lorenzo	San Lorenzu	405	447	447	2023
San-Nicolao	Santu Niculaiu	182	182	0	2021
Santa-Lucia-di-Mercurio	Santa Lucia di Mercoriu	1552	1967	1966	2021
Santa-Lucia-di-Moriani	Santa Lucia di Muriani	14	128	128	2021
Santa-Maria-Figanella	Santa Maria Ficaniedda	934	1406	1406	2021
Santa-Maria-Poggio	Santa Maria Poghju	75	75	75	2021
Sainte-Marie-Sichée	Santa Maria Sichè	662	797	796	2024
Sant'Andréa-di-Bozio	Sant'Andria di Boziu	181	144	144	2023
Sant'Andréa-di-Cotone	Sant'Andria di u Cotone	233	209	209	2021
Sant'Andréa-d'Orcino	Sant'Andria d'Urcinu	112	148	148	2024
Sant'Antonino	Sant'Antuninu	145	172	172	2022
Santa-Reparata-di-Balagna	Santa Riparata di Balagna	1052	887	887	2020
Santa-Reparata-di-Moriani	Santa Riparata di Muriani	105	98	98	2022
Santo-Pietro-di-Tenda	Santu Petru di Tenda	456	366	116	2023
Santo-Pietro-di-Venaco	San Petru di Venacu	181	182	182	2023
Sari-d'Orcino	Sari d'Urcinu	312	322	322	2024
Sari-Solenzara	Sari di Sulinzara	2179	1905	1846	2022
Sartène	Sartè	3152	3108	3108	2020
Scata	Scata	61	57	57	2021
Scolca	A Scolca	116	119	119	2023
Sermano	Sermanu	102	79	79	2023
Serra-di-Ferro	A Sarra di Farru	893	952	952	2022
Serra-di-Fiumorbo	Serra di Fiumorbu	324	260	260	2021
Serra-di-Scopamène	A Sarra di Scupamena	296	218	0	2024

COMMUNE D'IMPLANTATION	LOCU (COMMUNES CONCERNÉES)	NB DE PRISES CIBLE	NB DE PRISES CONSTRUITES	NB DE PRISES COMMERCIALISABLES	ANNÉES DE DÉPLOIEMENT
Serriera	A Sarrera	200	218	218	2024
Silvareccio	U Silvarecciu	148	110	110	2021
Sisco	Siscu	792	1036	1036	2021
Soccia	A Soccia	286	6	0	2022
Solaro	U Sulaghju	690	807	807	2023
Sollacaro	Suddacarò	473	287	287	2022
Sorbollano	Surbuddà	147	45	45	2023
Sorbo-Ocagnano	Sorbu è Ocagnanu	535	551	549	2021
Sorio	Soriu	147	23	0	2023
Sotta	Sotta	830	1200	1200	2020
Soveria	Suveria	92	91	91	2024
Speloncato	U Spiluncatu	336	392	391	2021
Stazzona	A Stazzona	60	59	59	2023
Taglio-Isolaccio	Tagliu è Isulacciu	472	441	441	2021
Talasani	Talasani	442	531	531	2021
Tallone	Tallone	246	279	279	2022
Tarrano	Tarranu	59	34	34	2024
Tasso	U Tassu	190	45	0	2024
Tavera	Tavera	363	341	341	2023
Tolla	Todda	231	216	216	2023
Tomino	Tuminu	273	268	268	2024
tox	Tocchisu	173	124	124	2024
Tralonca	Tralonca	28	88	88	2021
Ucciani	Aucciani	464	458	458	2022
Urbalacone	Urbalacunu	69	68	68	2022
Urtaca	Urtaca	226	241	241	2022
Vallecalle	Vallecalle	142	158	20	2022
Valle-d'Alesani	E Valli d'Alisgiani	132	108	108	2023
Valle-di-Campoloro	A Valle di Campulori	272	279	279	2021
Valle-di-Rostino	A Valle di Rustinu	190	146	0	2023
Valle-d'Orezza	A Valle d'Orezza	64	64	64	2023
Vallica	A Vallica	51	55	55	2022
Velone-Orneto	Vilone è Ornetu	120	87	87	2022
Venaco	Venacu	697	621	618	2022
Ventiseri	Vintisari	1379	1605	1605	2022
Venzolasca	A Venzulasca	1088	1376	1376	2020
Verdèse	A Verdese	89	71	71	2023
Vero	Veru	309	361	359	2023
Vescovato	U Viscuvatu	1780	2201	2200	2020

COMMUNE D'IMPLANTATION	LOCU (COMMUNES CONCERNÉES)	NB DE PRISES CIBLE	NB DE PRISES CONSTRUITES	NB DE PRISES COMMERCIALISABLES	ANNÉES DE DÉPLOIEMENT
Vezzani	Vizzani	404	291	290	2023
Vico	Vicu	1249	1261	1260	2024
Viggianello	Vighjaneddu	497	571	571	2021
Vignale	Vignale	193	179	179	2023
Ville-di-Paraso	E Ville di Parasu	216	231	231	2021
Vivario	Vivariu	522	268	268	2022
Volpajola	A Vulpaiola	260	288	281	2023
Zalana	Zalana	223	161	161	2023
Zérubia	Zirubia	151	121	0	2023
Zévaco	Zevacu	94	82	82	2023
Zicavo	Zicavu	355	343	317	2024
Zigliara	Ziddara	192	7	7	2022
Zilia	Zilia	273	314	314	2021
Zonza	Zonza	3452	3905	3905	2022
Zoza	Zoza	95	92	0	2023
Zuani	Zuani	86	61	61	2023
		172617	180380	170848	

Retrouvez en ligne les informations relatives au projet :

